


SMLOUVA O DÍLO č.27/03/2014/M
(dále též jen „Smlouva“)



Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Vestec**, IČO: 00507644
se sídlem Vestecká 3, 252 42 Jesenice u Prahy

(adresa pro doručování: Vestecká 3, 252 42 Jesenice u Prahy)
účet objednatele: Česká spořitelna a.s., č.ú. : 388054389/0800
DIČ: CZ
zastoupený ve věcech smluvních : Tiborem Švecem, starostou obce
zastoupený ve věcech technických : Romanem Kolaříkem, technickým dozorem

(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, IČO: 271 46 324
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143091

(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00)
účet zhotovitele: GEMB Praha a.s. č.ú. : 167800165/0600
DIČ: CZ27146324

zastoupený ve věcech smluvních : Františkem Šlehoferem, jednatelem
Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelem
Milanem Badou, prokuristou

Zastoupený ve věcech technických : Milanem Badou, prokuristou
(dále též jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají tímto podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
následující

SMLOUVU O DÍLO:

Článek 1.

Předmět Smlouvy-specifikace Díla

1.1. Předmětem této Smlouvy je provedení následující stavby či stavebních činností (dále též jen „Dílo“):
„ Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Na Skále v Obci Vestec “

1.2. Sjednané Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou „ není zpracována “
(dále též jen „Projektová dokumentace“), přičemž provedení Díla bylo pravomocně povoleno:
a) pravomocným územním rozhodnutím „ není vydáno “,
b) pravomocným stavebním povolením „ není vydáno “

1.3. Není-li v této Smlouvě dohodnuto něco jiného, pak postačí, dodá-li zhotovitel objednateli pouze
doklady nutné k převzetí a dalšímu užívání Díla, jsou-li vyžadovány platnými právními předpisy.

1.4. Není-li sjednáno něco jiného, není předmětem Díla zásadně jakákoliv projekční činnost, inženýrská činnost
včetně zajišťování územních, stavebních či jiných správních rozhodnutí a ani zajišťování jakýchkoliv stanovisek či
povolení. Všechny tyto činnosti zajišťuje vždy objednatel a je povinen s nimi zhotovitele řádně seznámit.

Článek 2.

Základní ustanovení

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí provést pro objednatele sjednané Dílo a objednatel se
zavazuje Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

Článek 3. Cena Díla a způsob jejího zaplacení

3.1. Celková cena za provedení Díla činí: 1 173 396,24 Kč (slovy: „ jedenmilionjednostosedmdesátřítisícřístadevadesátšest korun českých a dvacetčtyři haléřů“) včetně příslušné daně z přidané hodnoty, tj. 969 748,96 Kč bez DPH.

Tato cena je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě.

Celková cena díla bude stanovena na základě skutečně provedených prací.

K ceně díla bude přičtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění s výjimkou stavebních a montážních prací zařazených v klasifikaci produkce CZ-CPA platné od 1.1.2008 do kódů 41-43, u kterých dochází k přenesené daňové povinnosti v souladu § 92e zákona o DPH.

3.2. Objednatel má právo požadovat, aby byly v rámci Díla zapracovány určité věci, výrobky, materiály, práce či výkony od objednatelem určeného subdodavatele (případně též i přímo od objednatele), avšak jen tehdy uhradí-li objednatel zhotoviteli předem nad rámec sjednané ceny Díla i cenu těchto věcí, výrobků, materiálů, prací či výkonů, ledaže by již byly součástí rozpočtu popsaného v čl. 3.1. této Smlouvy.

3.3. Objednatel se zavazuje celkovou cenu Díla sjednanou v čl. 3.1. této Smlouvy uhradit následujícím způsobem:

3.3.1. Zhotovitel požaduje poskytnutí zálohy na sjednanou cenu Díla ve výši 0 .-Kč splatné na základě faktury vystavené ke dni podpisu této Smlouvy a splatné nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.

3.3.2. Platby na sjednanou cenu Díla budou objednatelem hrazeny dle faktur zhotovitele vydaných na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny Díla. Na základě soupisu provedených prací bude vystavena faktura s 14ti denní splatností, která bude odsouhlasena objednatelem, příp. jeho zástupcem. Objednatel není oprávněn k bezdůvodnému odepření tohoto souhlasu. Odepře-li objednatel neoprávněně odsouhlasit předložený soupis provedených prací, byť ze záznamů ve stavebním (montážním) deníku vyplývá, že práce předložené k odsouhlasení byly provedeny, pak je zhotovitel oprávněn k fakturaci těchto prací i bez jejich objednatelem odsouhlasení soupisu.

3.3.3. Konečnou fakturu uhradí objednatel po dokončení Díla a jeho převzetí do 14ti dnů ode dne jejího doručení. Tato lhůta se přiměřeně prodlužuje v závislosti na odstraňování případných vad a nedodělků. K vystavení konečné faktury není zhotovitel oprávněn dříve než po podpisu předávacího protokolu, kterým objednatel převezme Dílo od zhotovitele či od okamžiku, kterým se Dílo považuje za převzaté. Je-li podpis předávacího protokolu neoprávněně objednatelem odmítnut.

3.4. Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění Díla, jestliže objednatel bude v prodlení s placením částek vyúčtovaných fakturami zhotovitele, aniž by zde byly vzneseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných částek, a toto prodlení neodstraní ani do 5 dnů od výzvy zhotovitele. O dobu, po kterou zhotovitel oprávněně pozastavil provádění Díla, se prodlužují dohodnuté termíny provedení Díla. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s placením částek vyúčtovaných fakturami nebo konečnou fakturou, je zakázáno objednateli Dílo, včetně jeho součástí a příslušenství, užívat či jinak provozovat. Nebude-li dohodnuto něco jiného tak, v případě porušení tohoto zákazu ztrácí objednatel veškeré nároky plynoucí mu z této Smlouvy vůči zhotoviteli, včetně nároků z odpovědnosti za vady a záruky za jakost a vzniká mu povinnost platit zhotoviteli týdně částku ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla jako úhradu za užívání Díla. Po dobu pozastávky provádění Díla nese objednatel nebezpečí škody na Dílo. Do doby, než je celá dlužná částka objednatelem uhrazena nebo její uhrazení dostatečně zajištěno poskytnutím jistoty dle § 2012 a násl. obč.zák., je zhotovitel oprávněn odepřít předání Díla či jeho nedokončené části objednateli.

3.5. Je-li cena Díla určena podle rozpočtu, pak se zásadně, ledaže by se účastníci výslovně dohodli jinak, tato Smlouva uzavírá s výhradou neúplnosti a nezávaznosti tohoto rozpočtu podle § 2622 obč.zák., tzn. že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění Díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy nebo o částku, oč nevyhnutelně převyšší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud, resp. rozhodce stanovený dle čl. 9.4. této Smlouvy.

Článek 4. Termín provedení Díla

4.1. Termín zahájení Díla

Předání staveniště zhotoviteli a zahájení Díla zhotovitelem proběhne dne: 12.5.2014

4.2. Konečný termín provedení Díla

Celé Dílo je třeba řádně komplexně dokončit a předat jej objednateli v termínu nejpozději do 27.5.2014 .

4.3. Sjednaný konečný termín je nutno zásadně vždy dodržet a jeho změna je možná pouze v následujících případech:

a) Dohodnou-li se na změně konečného termínu účastníci této Smlouvy v písemném dodatku k této Smlouvě.

b) Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou splatné zálohy či dílčí platby na cenu Díla sjednaných v čl. 3.3. této Smlouvy, pak se o dobu prodlení objednatele s úhradou prodlužuje automaticky i doba konečného provedení Díla sjednaná v čl. 4.2. této Smlouvy.

c) Doba konečného provedení Díla sjednaná v čl. 4.2. této Smlouvy se dále automaticky prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl pokračovat v provádění Díla z důvodů opožděného předání staveniště objednatelem nebo z důvodů uvedených v čl. 3.4. či 5.1. této Smlouvy nebo z důvodů neposkytování potřebné součinnosti objednatelem nebo z důvodů nepříznivých povětrnostních či přírodních podmínek, a to vždy po dobu trvání těchto překážek. Bude-li to možné, bude o existenci těchto překážek proveden zhotovitelem záznam ve stavebním (montážním) deníku.

Ve všech případech uvedených v čl. 4.3. písm. b) a c) Smlouvy nese nebezpečí škody na Díle objednatel, a po celou dobu svého prodlení.

Článek 5. Provádění Díla, práva a povinnosti účastníků při provádění Díla

5.1. Ujednání k rozsahu Díla; změna Díla

5.1.1. Dílo musí být provedeno zhotovitelem, včetně svých součástí a příslušenství, v rozsahu, provedení a kvalitě dohodnuté v této Smlouvě, jinak vždy v takovém rozsahu, provedení a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se Dílo obvyklé a zpravidla užívá. Zhotovitel zůstává vlastníkem věcí, které opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se tyto věci stanou součástí nebo příslušenstvím Díla (namontováním, zapracováním a obdobným způsobem) nebo do doby předání Díla objednateli.

5.1.2. V případě, kdy u prováděného Díla vyvstane potřeba jeho dílčích změn nebo rozšíření či omezení jeho rozsahu mimo rozsah nebo způsob provedení sjednaný Smlouvou (dále jen „Změny“) a k takovým Změnám u obdobného Díla běžně dochází např. v důsledku toho, že se konkretizují požadavky na Dílo či se upřeshňují podmínky, za nichž bude Dílo provedeno, bude tato situace řešena takto:

- objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla či jeho rozšíření a zhotovitel je takovou změnu či rozšíření povinen za úhradu provést, jestliže Změnami nedojde k zásadní změně rozsahu a způsobu provádění sjednaného Díla;

- účastníci se pokusí dohodnout na změně ceny za Dílo vyvolané Změnou;

- nedojde-li mezi účastníky k dohodě o změně ceny za Dílo, platí přiměřeně ustanovení § 2614 obč. zák., kdy při omezení rozsahu Díla náleží zhotoviteli cena Díla přiměřeně snížená a naopak při zvýšení rozsahu Díla pak cena přiměřeně zvýšená, kdy bude vycházeno z ceny jednotlivých položek uvedených v rozpočtu.

5.1.3. Ke změně Díla může dojít také tehdy, jestliže je taková změna nutná v důsledku skutečností, které zhotovitel v době uzavření Smlouvy neznal nebo je nemohl znát ani rozumně předvídat; nedojde-li k jiné dohodě, je v takovém případě zhotovitel povinen Dílo provést tak, aby se ve své konečné podobě co nejvíce blížilo Dílu, na jehož provedení se účastníci dohodli.

5.1.4. Nebude-li sjednáno něco jiného, pokud se Změnami ve větším rozsahu zvýší časová náročnost na provedení Díla, pak se přiměřeně posunují termíny pro jeho konečné provedení.

5.2. Kvalita a náležitosti provedení Díla

Dílo dodávané podle této Smlouvy, včetně všech součástí Díla, musí kumulativně splňovat následující požadavky:

- a) Dílo musí mít vlastnosti výslovně sjednané Smlouvou a jejími přílohami nebo vyplývající ze schválené Projektové dokumentace a v mezích těchto dokumentů i pokyny a požadavky objednatele.
- b) Dílo musí vyhovovat právním předpisům platným v České republice, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím předpisům k tomuto zákonu,

5.3. Informace a podklady pro provádění Díla

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace, údaje a jiné dokumenty, které jsou podkladem pro provedení Díla a které jsou nutné pro řádné provedení Díla. Objednatel tak v tomto směru odpovídá za úplnost a správnost takto předaných a poskytnutých podkladů.

Objednatel je takto zejména povinen předat zhotoviteli tyto listiny a dokumenty:

- pravomocná rozhodnutí citovaná v čl. 1.2. této Smlouvy a stejně tak i Projektovou dokumentaci, je-li ze strany stavebního úřadu vyžadována; stejně tak je objednatel povinen předložit kopie všech vyjádření a stanovisek vydaných ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů v průběhu územního a stavebního řízení, především pak kladná vyjádření a stanoviska uživatelů a správců inženýrských sítí a dalších objektů včetně zákresu všech inženýrských sítí a dalších objektů, které by mohli být prováděním Díla dotčeny.
- listiny a dokumenty prokazující oprávnění objednatele a stejně tak i zhotovitele k užívání staveniště v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla včetně možnosti bezpečného uskladnění či uložení materiálu potřebného pro provedení Díla.

5.4. Místo plnění

Není-li sjednáno něco jiného, je místem plnění Díla ulice Na Skále v Obci vestec

5.5. Postup při plnění díla a kontrola plnění díla

5.5.1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel zásadně samostatně, aby bylo dosaženo sjednaného Díla, kdy zhotovitel vychází z údajů obsažených v dokumentech předaných mu v souladu s čl. 5.3. této Smlouvy. Jestliže lze Dílo nebo jeho části plnit několika způsoby či variantami, náleží právo volby primárně objednateli. V takových případech zhotovitel vyzve objednatele k určení způsobu plnění.

5.5.2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem (písemnou výzvou či záznamem ve stavebním nebo montážním deníku apod.), nejméně však vždy dva dny předem, ke kontrole a prověření všech prací a konstrukcí Díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a dále k veškerým stanoveným zkouškám materiálů, výrobků, instalací, montáží, prací a popř. jiných činností, které je zhotovitel povinen provádět. Nedostaví-li se objednatel i přes výzvu zhotovitele ve stanoveném termínu ke kontrole a prověření prací, má se za to, že takto kontrolované části Díla byly řádně provedeny.

5.6. Stavební (montážní) deník

5.6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění Díla až do doby úplného dokončení Díla a jeho převzetí objednatelem stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy a řádné provádění Díla, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a další podstatné údaje dokumentující průběh zhotovování Díla. Stavební deník bude veden ve smyslu ustanovení stavebního zákona a § 6 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí obsahovat náležitosti vyplývající z těchto právních předpisů. Nevyžadují-li právní předpisy vedení stavebního deníku, bude zhotovitelem veden montážní deník (pro něj v případě této Smlouvy platí totéž co pro stavební deník).

5.6.2. Objednatel je oprávněn stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li objednatel se záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, připojí k jeho záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.7. Dokončení Díla, předání a převzetí Díla

5.7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla objednateli. Povinnost předat Dílo objednateli se považuje za splněnou podpisem předávacího protokolu, ve kterém účastníci vzájemně potvrdí předání a převzetí celého Díla.

5.7.2. Předání a převzetí Díla se uskuteční v den, který zhotovitel oznámí jako termín jeho předání objednateli nejméně 3 dny předem. O předání a převzetí Díla se sepíše předávací protokol. Před sepsáním předávacího protokolu je objednatel povinen Dílo s odbornou péčí prohlédnout a všechny zjištěné vady do protokolu uvést. Pokud se objednatel k převzetí Díla nedostaví, nebo odmítne Dílo převzít nebo sepsat či podepsat předávací protokol platí, že k předání a převzetí Díla došlo okamžikem, kdy mělo dojít k předání Díla a sepsání předávacího protokolu - v takovém případě postačí, jestliže zhotovitel umožní objednateli s Dílem volně nakládat, aniž by nadále nesl nebezpečí škody na Díle či že došlo ke zcela neformálnímu předání a převzetí Díla.

5.7.3. Objednatel je povinen řádně provedené Dílo převzít, přičemž platí, že pro účely posouzení otázky, zda zhotovitel provedl Dílo řádně, se považuje za řádně provedené Dílo i takové Dílo, které je dokončeno alespoň ve všech jeho podstatných částech a je v době předání způsobilé plnit své smluvené nebo obvyklé funkce, a to i tehdy, jestliže vykazuje dílčí běžné nedostatky či závady nebo tzv. kosmetické vady. Všechny tyto nedostatky či závady budou posuzovány podle pravidel týkajících se nároků z vad Díla.

5.7.4. Je-li v čl. 1 této Smlouvy dohodnuto, že řádné provedení Díla má být prokázáno provedením zkoušek, považuje se za předání Díla teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami. Pro zápis se obdobně uplatní ustanovení o předávacím protokolu podle předchozích odstavců tohoto čl. 5.7. Smlouvy. Jestliže nemůže zhotovitel zkoušky provést v důsledku nedostatku součinnosti objednatele a nedojde-li k jiné dohodě o dodatečném provedení zkoušek, má se za to, že Dílo bylo úspěšně, řádně a včas předáno a zkoušky není třeba provádět.

Článek 6.

Záruka za jakost Díla, vady Díla

6.1. Pro Dílo a veškeré jeho součásti se sjednává záruka zhotovitele za jakost Díla (dále též jen „záruka“): zhotovitel přejímá závazek, že dodané Dílo a jeho součásti bude po určenou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

6.2. Není-li ve Smlouvě dohodnuto něco jiného, tak záruční doba počíná běžet předáním a převzetím Díla a končí uplynutím sjednané doby.

6.3. Záruční doba činí: 36 měsíců

a) Základní záruční doba činí zásadně 36 měsíců na celé Dílo a všechny jeho součásti, není-li sjednáno jinak.
b) U jednotlivých věcí tvořících součást Díla může být záruční doba kratší než doba sjednaná pod písm. a), jestliže výrobce těchto věcí poskytuje sám záruku kratší - záruční doba pak činí tuto záruční dobu poskytovanou výrobcem.

6.4. Záruka za jakost Díla se neuplatní v případech, kdy k vadě dojde v důsledku nesprávného a neodborného zacházení s Dílem nebo v důsledku běžného opotřebení Díla nebo v důsledku jiného vnějšího nepředvídatelného vlivu či síly. Záruka za jakost Díla se dále nevztahuje na vady, které musely být objednateli zřejmé již při převzetí Díla a přesto nepožadoval jejich odstranění nebo na vady, ke kterým došlo v důsledku poskytnutí vadné součinnosti objednatele nebo v důsledku vad věcí opatřených k provedení Díla objednatel, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče vadnost této součinnosti nebo věcí rozpoznat nebo na jiné vady, které nejsou svou podstatou vadou jakosti.

6.5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou vady Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů poté, kdy se o vadách Díla skutečně dozví. V opačném případě bude pozdní oznámení vad Díla považováno za neuskutečněné.

6.6. V případě včasného oznámení vad Díla objednatel způsobem dle předchozího odstavce je objednatel povinen v rámci tohoto oznámení uplatnit některý z druhů nároků z vad uvedených v ustanovení § 2615 obč.zák. ve spojení s ustanoveními § 2099 a násl. obč.zák., a to vždy s přihlédnutím k povaze objednatel oznámené vady. Bez ohledu na výše uvedené je však objednatel vždy povinen uplatnit přednostně nárok na odstranění vad Díla (ledaže by to neumožňoval charakter oznámené vady), přičemž zhotoviteli náleží právo volby, zda vady odstraní formou opravy či dodáním náhradních věcí za věci vadné; pokud má Dílo právní vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nebo zajistit objednateli potřebnou právní ochranu, aby nevznikla objednateli újma.

Zhotovitel je povinen oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad výše uvedeným způsobem uspokojit co nejrychleji po jejich řádném a včasém oznámení objednatelem, nejpozději do 2 měsíců od provedení včasného a řádného oznámení vad objednatelem. V případě, kdy je odstranění vad Díla mimořádně složité a technicky náročné, prodlužuje se přiměřeně lhůta k jejich odstranění, nejpozději však takové vady musí být odstraněny do 6 měsíců od provedení jejich včasného a řádného oznámení, nebude-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Pokud jsou tímto způsobem oznámené vady včas a v pořádku odstraněny, nepřichází ze strany objednatele v úvahu možnost uplatňování jakékoli náhrady škody způsobené těmito vadami.

Článek 7. Sankční ujednání

7.1. Od Smlouvy je možné odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě a v dalších případech, kdy to umožňuje občanský zákoník.

7.2. Odstoupení objednatele
Za důvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinností zhotovitele:

- a) jestliže zhotovitel bude po dobu delší než 30 dní v prodlení s plněním sjednaného termínu dokončení Díla a toto prodlení neodstraní nejpozději do 15 dnů poté, co jej k tomu objednatel písemně vyzve,
- b) jestliže objednatel v průběhu provádění Díla upozorní zhotovitele na určitou vadu či vadný postup při provádění Díla a zhotovitel závadný stav neodstraní nejpozději do 14 dnů od upozornění nebo bude přes upozornění pokračovat v provádění Díla vadným způsobem nebo přes upozornění bude dále vadný postup opakovat.

7.3. Odstoupení zhotovitele
Za důvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinností objednatele:

- a) jestliže objednatel bude po dobu delší než 15 dnů v prodlení s placením částek vyúčtovaných dílčími fakturami, aniž by zde byly vzneseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných částek, a toto prodlení neodstraní ani 15 dnů od písemné výzvy zhotovitele;
- b) jestliže objednatel bude přes upozornění po dobu delší než 15 dnů v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro provádění Díla nebo jiné povinnosti vyplývající pro objednatele z této Smlouvy a toto prodlení neodstraní nejpozději do 15 dnů poté, co jej k tomu zhotovitel písemně vyzve.

7.4. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:

- a) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním Díla; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,005 % z dosud neuhrazené ceny Díla za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z celkové ceny Díla;
- b) jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených vytknutých při převzetí Díla nebo s odstraněním reklamovaných záručních vad; smluvní pokuta v tomto případě činí 100,- Kč za každý případ vytknuté vady a za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z celkové ceny Díla.

7.5. Zhotovitel má vůči objednateli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:

- a) jestliže se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny Díla po dobu delší 5 dnů od data jejich splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,005 % z dlužné částky denně;
- b) jestliže objednatel bude po dobu delší než 15 dní v prodlení s poskytnutím své součinnosti dle Smlouvy a toto prodlení neodstraní ani do 7 dnů po písemné výzvě zhotovitele; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,005 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení, maximálně však 10% z celkové ceny Díla.

Článek 8. Součinnost objednatele

8.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k řádnému provedení Díla, a to s ohledem na charakter Díla, místo a způsob jeho provedení. Není-li dohodnuto něco jiného, je objednatel povinen zejména poskytnout zhotoviteli veškeré informace potřebné k provedení Díla; zajistit a zpřístupnit zhotoviteli bezplatně v potřebném rozsahu staveniště a vytvořit zde zhotoviteli a jeho zaměstnancům podmínky v souladu s obecně závaznými právními předpisy z oblasti hygieny, bezpečnosti práce a podmínky umožňující zhotoviteli nerušené provádění Díla; udržovat staveniště ve stavu umožňujícím řádné provedení Díla, včetně příp. zkoušek v

termínech dle Smlouvy a zajistit dodávky energií a médií a dále věci a zařízení nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla; řádně a včas opatřit věci, které mají být součástí Díla a jejich opatření je povinností objednatele. Další součinnost vyplývá také z jiných ustanovení Smlouvy.

8.2. Objednatel je povinen poskytnout součinnost v rozsahu a v termínech uvedených ve výzvě zhotovitele k poskytnutí součinnosti.

Článek 9. Ostatní a závěrečná ustanovení

9.1. Tato Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho ustanoveními § 2586 a násl. upravujícími smlouvu o dílo. Pro účely této Smlouvy vylučují smluvní strany s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 obč. zákoníku jakékoliv obchodní zvyklosti vztahující se k předmětu plnění dle této Smlouvy, tj. k Dílu, či k odvětví, v němž smluvní strany působí. Smluvní strany se budou řídit výhradně touto Smlouvou a občanským zákoníkem.

9.2. Veškeré dohody či smlouvy, kterými se mění, ruší či doplňuje Smlouva, musí mít písemnou formu, a to primárně formu číslovaného dodatku k této Smlouvě, a musí být podepsány osobami k tomu oprávněnými. Tato sjednaná forma není zejména splněna tehdy, jedná-li se o pouhý zápis z jednání stran, zápis ve stavebním deníku, zápis v předávacím protokolu atp., ledaže by ze Smlouvy pro jednotlivé případy vyplývalo něco jiného.

9.3. Ve všech případech, kdy je pro účinnost určitého úkonu třeba jeho doručení nebo oznámení druhé straně, nabývá úkon účinnosti kromě okamžiku skutečného doručení i v tomto případě: jestliže je písemnost doručována doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiné osoby, která má udělenou platnou poštovní licenci ve smyslu příslušných právních předpisů či veřejnou datovou síť, pokládá se za doručenu také tehdy, jestliže se odesílateli zásilka odeslaná na adresu pro doručování vrátí jako nevyzvednutá, nevyžádaná nebo z jiného jakéhokoliv důvodu nepřevzatá, a to dnem marného pokusu o doručení.

9.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že případný spor z této smlouvy o zaplacení ceny Díla a jejího příslušenství, o zaplacení smluvní pokuty bude rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze. Smluvní strany se podrobí statutům a řádům tohoto zvoleného rozhodčího soudu platným v době zahájení řízení. Místem rozhodčího řízení bude Praha.


9.5. Účastníci prohlašují, že se před podpisem této Smlouvy seznámili v dostatečném rozsahu s obsahem této Smlouvy a se všemi dalšími skutečnostmi důležitými pro její uzavření. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

9.6. Účastníci tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů pod tuto Smlouvu; okamžikem oboustranného podpisu se Smlouva stává platnou a účinnou.

Ve Vestci dne ~~11.4.~~ 2014

V Praze dne 27.3.2014

Podpis objednatele:




Obec Vestec
Tibor Švec, starosta

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Podpis zhotovitele:
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/3
153 00 Praha 5 - Buzová
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel. čísla 257 811 512 / 257 811 513

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
František Šlehofer, jednatel
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel
Milan Bada, prokurista

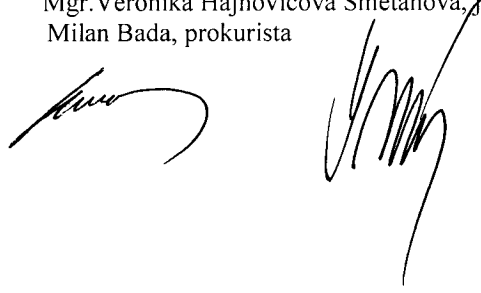

akce : rekonstrukce povrchu komunikace Na Skále

popis položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	cena
Komunikace				
řezy stávající komunikace	m	12,00	55,00	660,00
výbourání částí stávajících komunikací vč.likvidace	m2	90,00	65,00	5 850,00
výbourání lokálních částí panel.ploch s event.dovyčištěním spar panelů	m2	1 540,00	25,00	38 500,00
vyspravení lokálních částí panel.ploch s event.dovyčištěním spar panelů	m	16,00	340,00	5 440,00
dod.a mont.obrub(např.T10,LINEA,...)	m2	10,00	240,00	2 400,00
odkopy částí u rozšíření vč.zpětného konstrukčního doplnění ze ŠD 0/32	m2	1 650,00	10,00	16 500,00
odkopy částí u rozšíření vč.zpětného konstrukčního doplnění ze ŠD 0/32	m2	1 650,00	210,00	346 500,00
infiltr.postřík asf.emulzí	m2	1 650,00	10,00	16 500,00
asf.bet.pro podklad.vrstvy ACO 16+ tl.50mm	m2	1 650,00	220,00	363 000,00
spojovací postřík asf.emulzí	m2	1 650,00	45,00	45 000,00
asf.bet.pro obrus.vrstvy ACO 11 tl.40mm	m	1 000,00	45,00	22 500,00
zpevněné ŠD krajnice š.500 mm	m2	500,00	45,00	900,00
plošné doplnění prosátou ornici prostorů za krajnicemi	m	12,00	75,00	900,00
profézování napoj.spar se zálivkou				863 750,00
MEZISOUČET				
Kabelová přípojka závory				
zemní protlak komunikace Na Průhoně vč.chráničky dl.8,00 m	m	8,00	2 355,00	18 840,00
chránička pod budoucí cyklostezkou dl.5,00 m	m	5,00	260,00	1 300,00
ryha 0,40x0,60 vč.podpískování a zpětného zásypu	m	148,00	194,02	28 714,96
kabel AYKY 4x16mm vč.montáže	m	200,00	193,36	38 672,00
zemní drát FeZn 10mm vč.montáže	m	200,00	80,52	16 104,00
ochranná folie vč.montáže	m	148,00	16,00	2 368,00
				105 998,96
MEZISOUČET				
cena bez DPH				969 748,96
DPH 21%				203 647,28
cena vč.DPH				1 173 396,24

doba vlastního provádění prací(kalend.den) : 14 dnů

možný termín zahájení od objednání(kalend.den) : do 7 dnů po podpisu SOD

Stavební společnost Sležhofer, s.r.o.
 Prvopřátova 2111/33
 153 008 2111
 IČO:27146324 DIČ:CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, 257 811 813

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 68. schůzi konané dne 07.04.2014 (usnesení č. URO 2014/04/01) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 11.4.2014



.....

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice

OBEC VESTEC

IČO: 00507644
Vestecká 3, Vestec
959 49 tajemnice u Prahy
